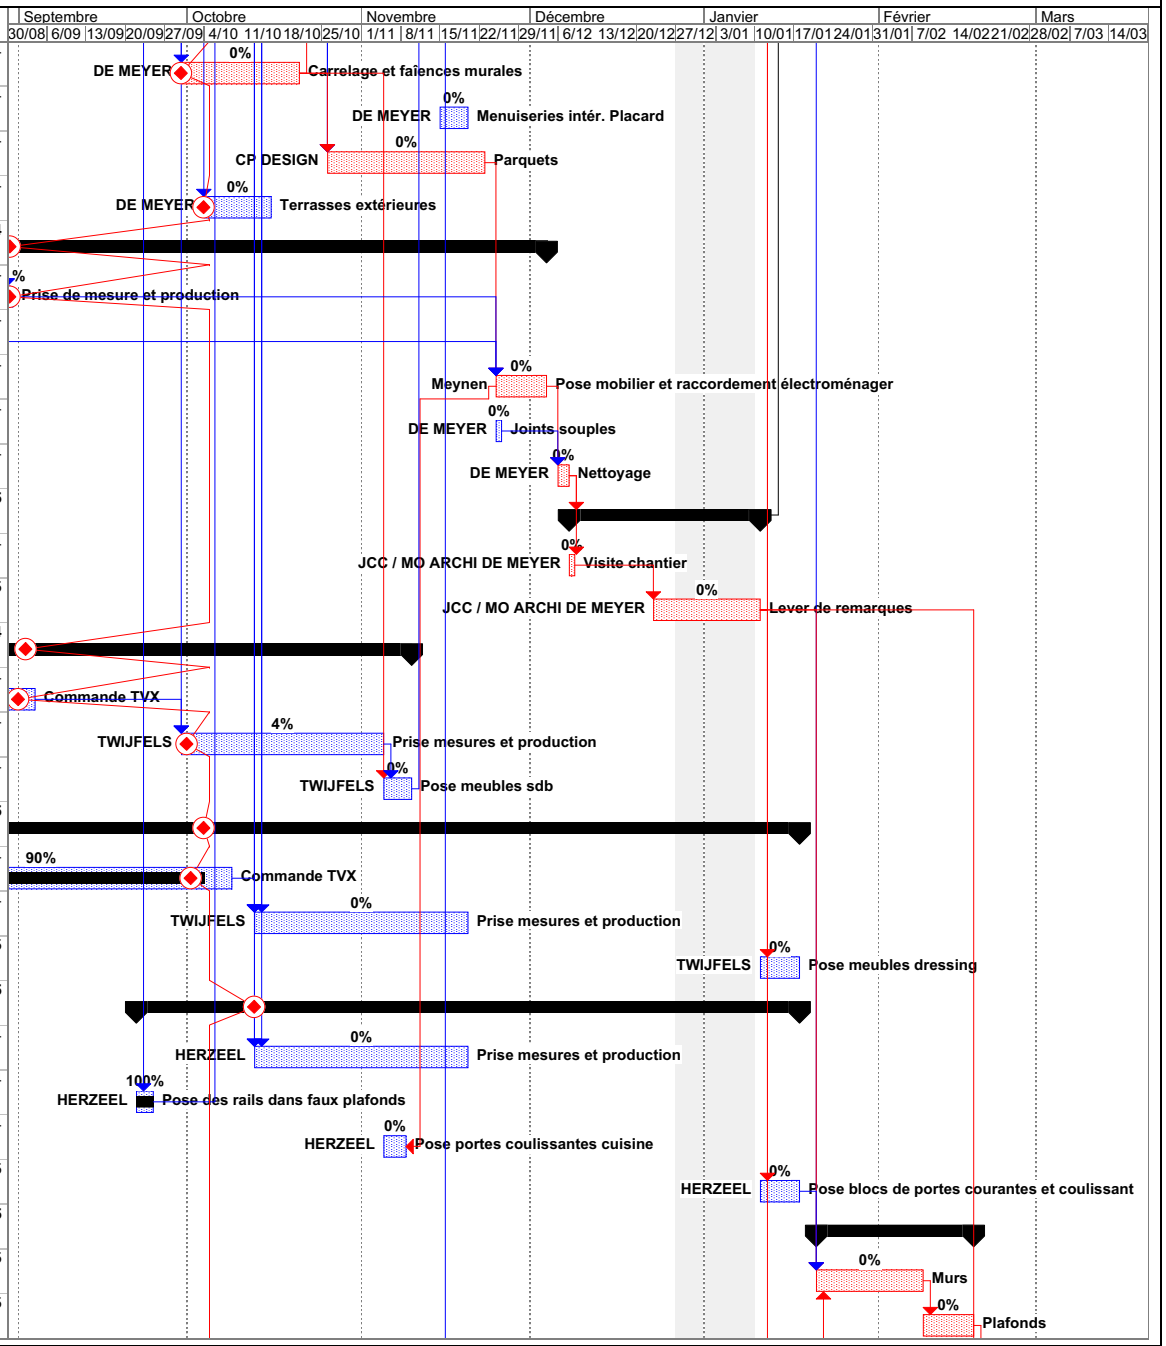N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
59	Carrelage et faïences murales	15 jours	30/09/04	20/10/04
60	Menuiseries intér. Placard	5 jours	15/11/04	19/11/04
61	Parquets	17 jours	26/10/04	22/11/04
62	Terrasses extérieures	10 jours	4/10/04	15/10/04
63	**Cuisine**	**98 jours**	**24/06/04**	**3/12/04**
64	Prise de mesure et production	1 jour	30/08/04	30/08/04
65	Commande électroménager	2 jours	24/06/04	25/06/04
66	Pose mobilier et raccordement électroménager	7 jours	25/11/04	3/12/04
67	Joints souples	1 jour	25/11/04	25/11/04
68	Nettoyage	2 jours	6/12/04	7/12/04
69	**Réception Provisoire**	**14 jours**	**8/12/04**	**10/01/05**
70	Visite chantier	1 jour	8/12/04	8/12/04
71	Lever de remarques	3 jours	23/12/04	10/01/05
72	**Menuiserie intérieure sdb**	**70 jours**	**2/08/04**	**9/11/04**
73	Commande TVX	24 jours	2/08/04	3/09/04
74	Prise mesures et production	25 jours	30/09/04	4/11/04
75	Pose meubles sdb	3 jours	5/11/04	9/11/04
76	**Menuiseries intérieure dressing et sam**	**107 jours**	**2/08/04**	**17/01/05**
77	Commande TVX	49 jours	2/08/04	8/10/04
78	Prise mesures et production	25 jours	13/10/04	19/11/04
79	Pose meubles dressing	5 jours	11/01/05	17/01/05
80	**Portes intérieures**	**71 jours**	**22/09/04**	**17/01/05**
81	Prise mesures et production	25 jours	13/10/04	19/11/04
82	Pose des rails dans faux plafonds	3 jours	22/09/04	24/09/04
83	Pose portes coulissantes cuisine	2 jours	5/11/04	9/11/04
84	Pose blocs de portes courantes et coulissantes	5 jours	11/01/05	17/01/05
85	**Peinture**	**20 jours**	**21/01/05**	**17/02/05**
86	Murs	13 jours	21/01/05	8/02/05
87	Plafonds	7 jours	9/02/05	17/02/05
